



CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA-PR

Referência: Concorrência Presencial n.º 01/2026.

**Objeto: Pavimentação de estrada Rural em CBUQ, 108.550,00m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.**

Licitante: KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 32.861.900/0001-10

Endereço: RUA LAURY BECKERT

Bairro: CENTRO

CEP: 89875-000

Telefone: (49) 99934-6829

E-mail: pgktigrinhos@gmail.com

Inscrição Estadual: não consta

Cidade: Tigrinhos

Estado: Santa Catarina

Banco: Sicoob - 756

Agência: 3032

Conta- corrente:143341-5

A Empresa KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA-PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de **R\$ 24.712.268,85** (vinte e quatro milhões e setecentos e doze mil e duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Rua Laury Beckert, Centro, s/n, CEP: 89875-000, Tigrinhos/SC  
Fone: (49) 99934-6829 | E-mail: pgktigrinhos@gmail.com



2) O prazo de validade da proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. MATEUS ENDERLE.

Tigrinhos/SC, 30 de março de 2026.

KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA  
MATEUS ENDERLE (CPF n.º 090.128.949-30)  
ENG. CIVIL: CREA: 159741-0  
Sócio proprietário

Rua Rodolfo Wachholz, s/nº - Centro  
Tigrinhos-SC - CEP 89.875-000

KGP OBRAS E  
TRANSPORTES LTDA

32.861.900/0001-10

## ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: **15,28%** (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: **22,00%**

**Empresa: KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA**


**Menor Preço ( %) calculado... (6,00 %)**

**VALOR GLOBAL da Proposta:**

**R\$ 24.712.268,85**

### PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(6,00 %)	474,04	3.480,77	3.954,81
388,56	2.853,09	474,04	3.480,77	3.954,81	(6,00 %)	474,04	3.480,77	3.954,81
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(6,00 %)	742.667,08	41.694,44	784.361,52
24,28		29,62	-	29,62	(6,00 %)	612.423,12	-	612.423,12
47,19	13,30	57,57	16,23	73,80	(5,99 %)	93.723,96	26.422,44	120.146,40
0,45	0,19	0,55	0,23	0,78	(6,02 %)	36.520,00	15.272,00	51.792,00
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(6,00 %)	162.091,41	425.470,77	587.562,18
41,93		51,16	-	51,16	(5,99 %)	32.169,41	-	32.169,41
17,81		21,73	-	21,73	(6,01 %)	4.346,00	-	4.346,00
25,52		31,14	-	31,14	(5,98 %)	6.302,74	-	6.302,74
40,87	17,67	49,86	21,56	71,42	(6,01 %)	16.543,55	7.153,61	23.697,16
7,62	5,97	9,30	7,28	16,58	(6,01 %)	14.268,06	11.168,98	25.437,04
7,62	6,86	9,30	8,37	17,67	(6,01 %)	4.045,50	3.640,95	7.686,45
360,32	211,26	439,59	257,73	697,32	(6,00 %)	5.538,83	3.247,40	8.786,23
58,05		-	-	-	-	-	-	-
53,47		-	-	-	-	-	-	-
55,99		-	-	-	-	-	-	-
430,71	344,91	525,46	420,80	946,26	(6,00 %)	17.024,90	13.633,92	30.658,82
140,29		-	-	-	-	-	-	-
41,61		-	-	-	-	-	-	-
55,99		-	-	-	-	-	-	-
263,10	838,18	320,98	1.022,58	1.343,56	(6,00 %)	8.987,44	28.632,24	37.619,68
63,79		-	-	-	-	-	-	-
35,49		-	-	-	-	-	-	-
64,79		-	-	-	-	-	-	-
336,94	1.206,90	411,07	1.472,42	1.883,49	(6,00 %)	1.644,28	5.889,68	7.533,96
92,52		-	-	-	-	-	-	-
51,45		-	-	-	-	-	-	-
93,94		-	-	-	-	-	-	-
41,51	105,88	50,64	129,18	179,82	(6,00 %)	13.571,52	34.620,24	48.191,76
0,97		-	-	-	-	-	-	-
0,68		-	-	-	-	-	-	-
20,56		-	-	-	-	-	-	-
155,15	518,03	189,28	632,00	821,28	(6,00 %)	7.192,64	24.016,00	31.208,64
22,27		-	-	-	-	-	-	-
11,02		-	-	-	-	-	-	-
18,57		-	-	-	-	-	-	-
36,37		-	-	-	-	-	-	-
879,05	771,93	1.072,44	941,75	2.014,19	(6,00 %)	16.086,60	14.126,25	30.212,85
175,45		-	-	-	-	-	-	-
94,40		-	-	-	-	-	-	-
182,11		-	-	-	-	-	-	-

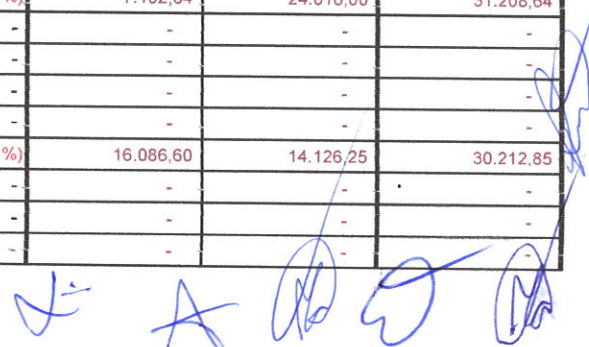

**PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL**

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
1.393,02	1.209,08	1.699,49	1.475,07	3.174,56	(6,00 %)	3.398,98	2.950,14	6.349,12
278,25		-	-	-	-	-	-	-
150,94		-	-	-	-	-	-	-
294,89		-	-	-	-	-	-	-
76,85	5.374,17	93,76	6.556,48	6.650,24	(6,00 %)	3.937,92	275.372,16	279.310,08
102,94	14,92	125,59	18,20	143,79	(6,00 %)	7.033,04	1.019,20	8.052,24
<b>usar preços unitários com 2 casas decimais.</b>					<b>(6,00 %)</b>	<b>7.270.928,60</b>	<b>5.859.757,80</b>	<b>13.130.686,40</b>
4,39		5,36	-	5,36	(5,96 %)	715.292,00	-	715.292,00
133,23	133,18	162,54	162,48	325,02	(6,00 %)	2.533.998,60	2.533.063,20	5.067.061,80
121,15	100,21	147,80	122,26	270,06	(6,00 %)	4.021.638,00	3.326.694,60	7.348.332,60
68,09		-	-	-	-	-	-	-
34,30		-	-	-	-	-	-	-
<b>usar preços unitários com 2 casas decimais.</b>					<b>(6,01 %)</b>	<b>2.868.368,49</b>	<b>6.653.699,07</b>	<b>9.522.067,56</b>
0,48		0,58	-	0,58	(6,45 %)	62.959,00	-	62.959,00
182,55	3.254,41	222,71	3.751,69	3.974,40	(6,00 %)	29.010,20	488.695,14	517.705,34
0,33		0,40	-	0,40	(6,98 %)	43.420,00	-	43.420,00
182,55	3.254,41	222,71	3.751,69	3.974,40	(6,00 %)	12.088,70	203.641,73	215.730,43
145,55	144,35	177,57	176,10	353,67	(6,00 %)	2.440.243,30	2.420.041,92	4.860.285,22
5,08						-	-	-
3,90						-	-	-
42,07						-	-	-
62,17						-	-	-
354,30	4.470,73	408,44	5.153,86	5.562,30	(6,00 %)	280.647,29	3.541.320,28	3.821.967,57
<b>usar preços unitários com 2 casas decimais.</b>					<b>(5,99 %)</b>	<b>106.584,22</b>	<b>255.994,43</b>	<b>362.578,65</b>
56,78	262,12	69,27	319,79	389,06	(6,00 %)	20.088,30	92.739,10	112.827,40
9,58	16,67	11,69	20,33	32,02	(5,99 %)	78.790,60	137.024,20	215.814,80
179,51	326,04	219,00	397,77	616,77	(6,00 %)	1.051,20	1.909,30	2.960,50
38,27	79,88	46,69	97,46	144,15	(6,00 %)	1.120,56	2.339,04	3.459,60
100,80	383,26	122,97	467,57	590,54	(6,00 %)	2.213,46	8.416,26	10.629,72
87,79	358,71	107,10	437,63	544,73	(6,00 %)	3.320,10	13.566,53	16.886,63
<b>usar preços unitários com 2 casas decimais.</b>					<b>(6,00 %)</b>	<b>279.641,67</b>	<b>41.416,06</b>	<b>321.057,73</b>
139,39	15,49	170,06	18,90	188,96	(6,00 %)	37.923,38	4.214,70	42.138,08
139,39	15,49	170,06	18,90	188,96	(6,00 %)	35.202,42	3.912,30	39.114,72
139,39	15,49	170,06	18,90	188,96	(6,00 %)	19.897,02	2.211,30	22.108,32
143,74	15,96	175,36	19,47	194,83	(6,00 %)	6.839,04	759,33	7.598,37
143,74	15,96	175,36	19,47	194,83	(6,00 %)	12.099,84	1.343,43	13.443,27
90,42	22,66	110,31	27,65	137,96	(6,00 %)	39.932,22	10.009,30	49.941,52
170,72	18,96	208,28	23,13	231,41	(6,00 %)	37.698,68	4.186,53	41.885,21
116,19	29,20	141,76	35,62	177,38	(5,99 %)	25.658,56	6.447,22	32.105,78
46,76	5,21	57,04	6,35	63,39	(6,01 %)	10.324,24	1.149,35	11.473,59
91,47	15,49	111,60	18,90	130,50	(6,00 %)	20.199,60	3.420,90	23.620,50
95,06	10,56	115,98	12,88	128,86	(6,00 %)	20.992,38	2.331,28	23.323,66
5.845,10	649,45	7.131,02	792,32	7.923,34	(6,00 %)	7.131,02	792,32	7.923,34
283,59	31,51	345,98	38,44	384,42	(6,00 %)	5.743,27	638,10	6.381,37
						<b>PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.</b>	<b>PREÇO GLOBAL MATERIAL</b>	<b>PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA</b>

**PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL**


PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
Desconto Final Calculado da Proposta %						46,26%	53,74%	
<b>(6,00 %)</b>						11.430.755,51	13.281.513,34	24.712.268,85



**[32.861.900/0001-10]**

**KGP OBRAS E  
TRANSPORTES LTDA**

Rua Rodolfo Wachholz, s/nº - Centro  
**[CEP 89.875-000 - Tigrinhos-SC]**



**KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA**

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%


Grupo	Quantidade	Valor Total da Proposta de Empresa	Preço do Projeto nº dias	Prioridade Nº	CONFINO Nº	Fonte do RECURSO	Fonte pretendida da Obra	Início pretendido da Obra	Nº dias para início Obra	Data da Proposta	Data	3º	4º	5º	6º	% S/ TOTAL
Município: HONORIO SERPA	1	24.712.268,85	180	180		SEAB	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			20/03/2026	10/07/26	10/10/26	10/11/26	11/01/26	11/01/26	100,00%
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	1	24.712.268,85	180	180		SEAB	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			20/03/2026	10/07/26	10/10/26	10/11/26	11/01/26	11/01/26	100,00%
Quantidade: 108.550,00 m2	1	24.712.268,85	180	180		SEAB	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			20/03/2026	10/07/26	10/10/26	10/11/26	11/01/26	11/01/26	100,00%
ITEM	N	Valor Total														
1	1	3.954.81														0,02%
2	1	784.361,52														3,17%
3	1	507.562,18														2,05%
4	2	13.130.686,40														53,13%
5	4	9.522.067,56														38,52%
TOTAL	6	321.057,73														1,30%

**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)**


ITEM	SERVÇOS	FONTES	1	2	3	4	5	6	Nº DE ETAPAS	% S/ ITEM
1T	SERVÇOS PRELIMINARES	TESOURO	3.954,81	-	-	-	-	-	1	0,02%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	784.361,52	-	-	-	-	-	1	3,17%
3T	DRENAGEM	TESOURO	507.562,18	-	-	-	-	-	1	2,05%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	6.505.343,20	-	-	-	-	-	2	53,13%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	2.381.537,65	-	-	-	-	-	4	36,52%
6T	MED-RO E SARETA	TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
7T	SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
10T	SERVÇOS DIVERSOS	TESOURO	62.680,13	88.104,89	46.204,98	45.474,41	45.535,46	53.150,88	6	1,47%
11T	ENCARGOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALS	TESOURO	TESOURO	8.003.901,81	6.633.448,09	2.421.746,61	2.426.011,06	2.425.833,40	2.796.431,85	6	100,00%

ITEM	SERVÇOS	FONTES	1	2	3	4	5	6	Nº DE ETAPAS	% S/ ITEM
1T	SERVÇOS PRELIMINARES	TESOURO	3.954,81	-	-	-	-	-	1	0,02%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	784.361,52	-	-	-	-	-	1	3,17%
3T	DRENAGEM	TESOURO	507.562,18	-	-	-	-	-	1	2,05%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	6.505.343,20	-	-	-	-	-	2	53,13%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	2.381.537,65	-	-	-	-	-	4	36,52%
6T	MED-RO E SARETA	TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
7T	SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
10T	SERVÇOS DIVERSOS	TESOURO	62.680,13	88.104,89	46.204,98	45.474,41	45.535,46	53.150,88	6	1,47%
11T	ENCARGOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALS	TESOURO	TESOURO	8.003.901,81	6.633.448,09	2.421.746,61	2.426.011,06	2.425.833,40	2.796.431,85	6	100,00%

Nome da Empresa: KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.861.900/0001-10

Assinatura: 

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CRI: MATEUS ENDERLE - CREA/SC - 187414-0

Assinatura: 

data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

data: \_\_\_\_\_

Valor Base de aprovação do orçamento (Decreto 19.886/22 do Pr.aul, que regulamenta a Lei 14.133/21): 24.712.268,85

20/03/2026 - sig

20/03/2026 - ter

Rua Rodolfo Wachholz, s/nº - Centro  
 CEP 89.875-000  
 Tigriinhos-SC

[32.861.900/0001-10]

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA  
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/20**

<b>IMPOSTOS</b>	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	<b>TOTAL =</b>	<b>6,65</b>
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>OBRAS</b>	<b>MATERIAIS</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	3,86	2,72
<b>RISCOS</b>	0,32	0,70
<b>SEGUROS E GARANTIAS</b>	0,50	0,48
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1,02	0,85
<b>LUCRO</b>	7,70	6,00
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>22,00</b>	<b>15,28</b>
<small>BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100</small>		
<b>BDI (OBRA)</b>	<b>22,00%</b>	
<b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>15,28%</b>	

<p>Representante da Empresa (Assinatura Digital): <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">32.861.900/0001-10</span></p> <p align="center"><b>KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA</b></p> <p align="center">Rua Rodolfo Wachholz, s/nº - Centro CEP 89.875-000 - Tigrinhos-SC</p> <p><b>MATEUS ENDERLE</b></p>	<p>Data da Proposta:</p> <p align="center">27/03/2026 - sex</p>
<p>Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):</p> <p align="center"><b>MATEUS ENDERLE - CREA PR-SC-1597410/D</b></p>	

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA  
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - LEI LICITAÇÃO Nº  
14.133/2021**



<b>IMPOSTOS</b>	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	<b>TOTAL =</b>	<b>6,65</b>
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>OBRAS</b>	<b>MATERIAIS</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	4,01	3,45
<b>RISCOS</b>	0,56	0,85
<b>SEGUROS E GARANTIAS</b>	0,40	0,48
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1,11	0,85
<b>LUCRO</b>	7,30	5,11
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>22,00</b>	<b>15,28</b>
<small>BDI=(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100</small>		
<b>BDI (OBRA)</b>	<b>22,00%</b>	
<b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>15,28%</b>	

## ANEXO V

### Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS		20,00 %
A2	SESI		1,50 %
A3	SENAI		1,00 %
A4	INCRA		0,20 %
A5	SEBRAE		0,60 %
A6	Salário Educação		2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00 %
A8	FGTS		8,00 %
A9	SECONCI		1,00 %
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	-	<b>37,80 %</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado		não incide
B2	Feriados		não incide
B3	Auxílio-Enfermidade		0,65 %
B4	13º Salário		8,33 %
B5	Licença Paternidade		0,05 %
B6	Faltas Justificadas		0,56 %
B7	Dias de Chuva		não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,07 %
B9	Férias Gozadas		10,07 %
B10	Salário Maternidade		0,03 %
<b>B</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A</b>	-	<b>19,76 %</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado		3,63 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,09 %
C3	Férias Indenizadas		0,67 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		1,75 %
C5	Indenização Adicional		0,31 %
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A</b>	-	<b>6,45 %</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	-	7,47 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	-	0,32 %
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	-	<b>7,79 %</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		-	<b>71,80 %</b>

**OBSERVAÇÕES:**

Empresa: <b>KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA</b>	Data da Proposta: <b>27/03/2026 - sex</b>
 <b>32.861.900/0001-10</b> <b>KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA</b>	 <b>MATEUS ENDERLE</b> Resp. Téc. Empresa:
<b>MATEUS ENDERLE</b> Representante Empresa:	

Rua Rodolfo Wachholz, s/nº - Centro  
 CEP 89.875-000 - Tigrinhos-SC


## Apêndice 24 – Encargos Sociais – Santa Catarina

SANTA CATARINA

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>22,80%</b>	<b>22,80%</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feriados	3,70%	Não incide	3,70%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,65%	0,87%	0,65%
B4	13º Salário	11,12%	8,33%	11,12%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,94%	Não incide	1,94%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	13,44%	10,07%	13,44%	10,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>49,92%</b>	<b>19,76%</b>	<b>49,92%</b>	<b>19,76%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,84%	3,63%	4,84%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,89%	0,67%	0,89%	0,67%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,33%	1,75%	2,33%	1,75%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%	0,41%	0,31%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>8,58%</b>	<b>6,45%</b>	<b>8,58%</b>	<b>6,45%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	10,83%	4,09%	18,87%	7,47%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%	0,43%	0,32%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>11,24%</b>	<b>4,40%</b>	<b>19,30%</b>	<b>7,79%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>92,54%</b>	<b>53,41%</b>	<b>115,60%</b>	<b>71,80%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET



IMPRESSELETTORIAL  
 ANEXO  
 ANEXO  
 ANEXO

CÓDIGO ITEM	ORDEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				ORÇAMENTO COM BDI				TOTAL GLOBAIS (R\$)
			DMT km XT1 X2	COMBUSTÍVEL (km)	MÃO DE OBRA SEM BDI	TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	RISCO UNITÁRIO SEM BDI	RISCO UNITÁRIO MATERIAL COM BDI	PREÇO UNIT. MÁG DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	
511000A	DERPRC	Rep. de pintura de concreto armado S.A.F. 100% PI			4,67	4,67	5,70	5,70	131,450,00	780,805,00	-	780,805,00	2,03 %
531000	DER	Brta. Grude			141,58	12,86	172,91	172,91	15,880,00	2.985.066,90	2.985.066,90	7.517.160,90	20,13 %
531300	DER	Mecânica de Brta. Grude			108,61	10,95	125,35	125,35	27.210,00	4.779.528,20	4.779.528,20	7.517.160,90	20,13 %
531300	DER	Brta. Brta.			72,44	7,24	79,68	79,68	-	-	-	-	-
531300	DER	Brta. Brta.			35,49	3,55	39,04	39,04	-	-	-	-	-
591000A	DERPRC	Impressão sem Enxada RR-IC - acastanhado			0,51	0,51	0,62	0,62	108,530,00	67.351,00	67.351,00	16.130.600,27	24,83 %
591000A	DERPRC	Fornecimento de enxada RR-IC - impressão			3.462,14	164,20	236,92	3.699,06	4.218,07	30.881,26	30.881,26	582.748,40	1,69 %
591100A	DERPRC	Plano de ligação com RR-IC - revestimento			0,35	0,35	0,43	0,43	184,450,00	48.679,90	48.679,90	48.679,90	0,16 %
591400B	DERPRC	Fornecimento de enxada RR-IC - revestimento			3.462,14	164,20	236,92	3.699,06	4.218,07	30.881,26	30.881,26	582.748,40	1,69 %
591500C	DERPRC	COM. + TRAPO + CAPA - Folha 2" - Quantidade menor que 10,000 km			153,56	15,36	168,92	168,92	131,424,33	2.959.965,02	2.959.965,02	5.170.451,97	15,03 %
591500C	DER	Capa fabricada Ch-1			5,40	0,54	5,94	5,94	-	-	-	-	-
591500C	DER	Brta. (Linha)			4,15	0,41	4,56	4,56	-	-	-	-	-
591500C	DER	Missa a quente			9,14	0,91	10,05	10,05	-	-	-	-	-
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.138,02	63,25	5.462,83	5.417,24	6.671,2	298.860,51	4.935.822,06	11,67 %
591500C	DERPRC	Fornecimento de CAP - CUBZ (Quantidade menor que 10,000 km)			4.756,10	5.13							
